

# 國立清華大學會議紀錄

一、會議名稱：「南校區學生宿舍新建工程委託規劃設計及監造技術服務案」

第五次擴大月工作會議

二、時間：108 年 12 月 18 日（星期三）下午 11 時 15 分

三、地點：清華大學校本部行政大樓 2 樓第二會議室

四、主席：顏東勇總務長

五、參加人員：詳會議簽到表

六、討論事項說明：

1. 設計單位報告事項。

(1) 預計 109.01.03~109.01.10 間辦理水保審查會議，盡量農曆年前召開會議。

(2) 屋頂水箱屋頂保留，但依圖所示，屋頂至水箱間距 60CM，再調整。

2. 回應 108.11.26 公聽會需求：

(1) 一樓旋轉梯調整位置及型式。

(2) 學生多功能交誼廳，設置投影設備及家具可移動。請使用單位住宿組確認投影布幕位置。

3. 學生簡易廚房變更名稱為學生輕食區。

4. 電信室設置，會後計中與廠商討論確認後，再給需求。

5. 標準層加大曬衣間並增加洗衣台，增加飲水機位置，交誼廳增加挑空。

6. 廚房排煙到屋頂排出。

7. 學生輕食區與餐廳油脂截油方式，保留至下次會議再討論。

8. 期程表要標誌出五大管線及瓦斯等項目。

9. 後續時程：

(1) 預計 109.01.15 水保開會，二月底完成，109.03.07 坡審送件，四

月底完成。

(2) 預計 3 月底建照掛號，6 月底建照取得。

(3) 藝術大樓預計採保留決標，希望本案同一個施工廠商。


10. 請設計單位依約於 108 年 12 月 28 日前正式提送細部設計書圖資料，以利後續時程推進。

11. 會後計中回覆：

(1) 12/18 南校區學生宿舍新建工程委託規劃設計及監造技術服務案

會議，依當日簡報所見設計圖面：電力電信機房為 7 米平方(附圖

1)，宿網機房(即弱電室所在位置)我們需求為 3 米\*3 米=9 米平方的空間，數量 2 間(3 樓、6 樓)，其餘樓層的弱電機房我們應該不會使用到。

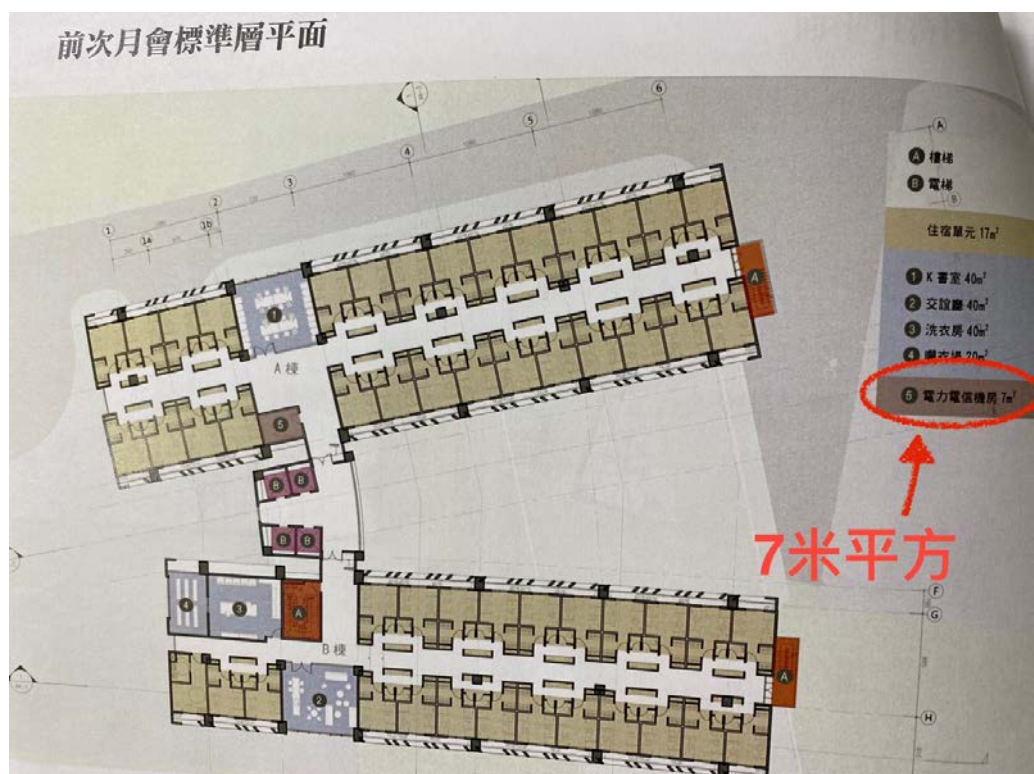


(2) 回應建築師的問題(高架地板的部份是否需要)：經與網路廠商討

論後，機房預估計有 600 條以上網路線，高架地板主要用來收容

網路線路，希望能提供高架地板。

- (3)電氣室與弱電室共用一個門進出(附圖 2)，因資安考量，我們希望弱電室(宿網機房)為獨立空間，是否未來議程可以再討論可行性。

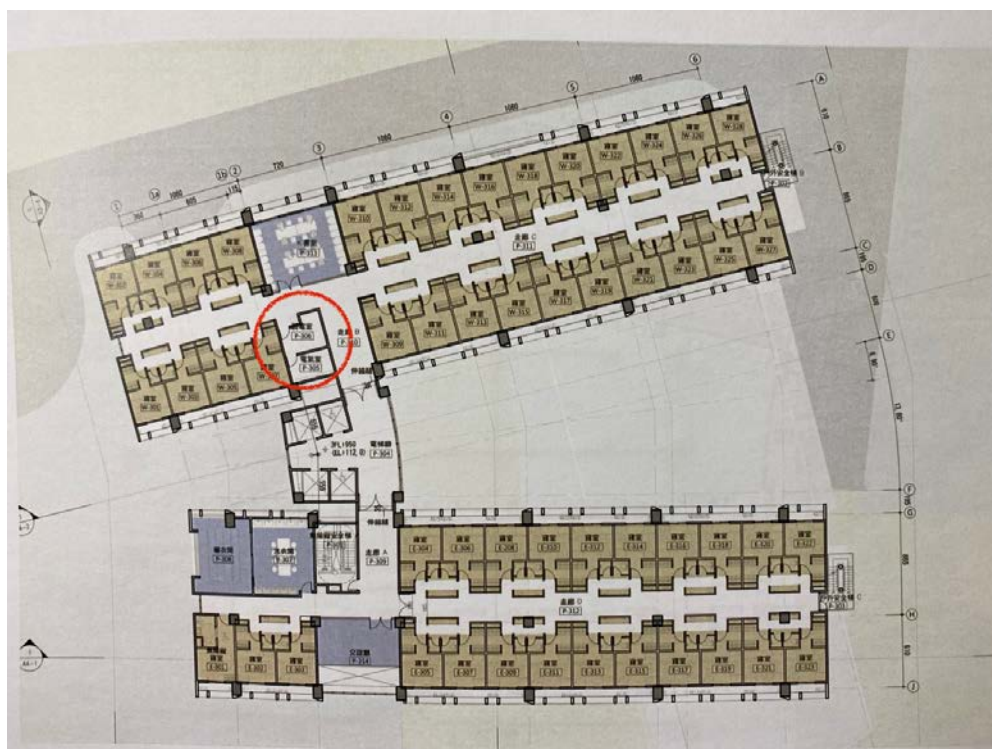

- (4)我們想知道網路線路的垂直管道、水平線槽規劃設計情形，是否未來議程可以請建築師說明。

12. 下次月會會議時間 109 年 01 月 15 日。

七、散會：上午 12 時 15 分。
